

تقرير زيارة رقم (6)

التاريخ: 2021/3/21

تم زيارة موقع المشتل بمنطقة اللجون/ الكرك بحضور كلا من :

م. طارق عكاشه/المركز الوطني للبحوث الزراعية

م. يحيى ابو صيني /المركز الوطني للبحوث الزراعية

م. غيث العموش/المقاول المنفذ للمشروع

أهداف الزيارة:

متابعة اعمال تركيب بيت البولي كاربونيت و البيوت البلاستيكية و المظلة و الانظمة الزراعية.

الانجازات :


تم الاطلاع على الاعمال المنجزة :

• بيت البولي كاربونيت

1. تم تثبيت الواح البولي كاربونيت بشكل جيد على الهيكل الخارجي .
2. تم تركيب طاولات التشتيل و تثبيتها و تمديد انابيب التدفئة .
3. تم تركيب لوحة التحكم (اللوحة غير مكتملة حيث لم يتم تركيب كامل القواطع) .
4. تم تركيب نظام التدفئة.
5. تركيب المرواح (نظام التبريد)
6. تم عمل قناة التصريف حسب التوصية في الزيارة السابقة.
7. النواقص :


- تركيب الابواب المزدوجة.
- تركيب الستائر.
- تركيب الكرتون(نظام التبريد).



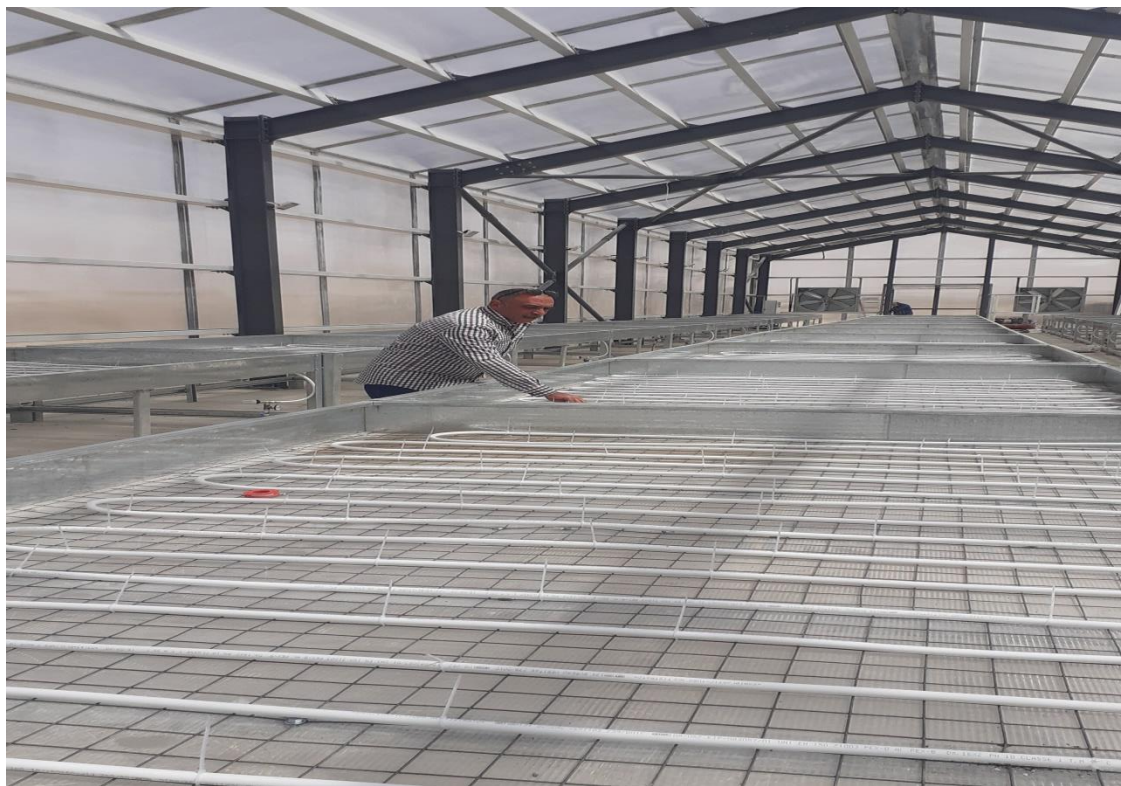





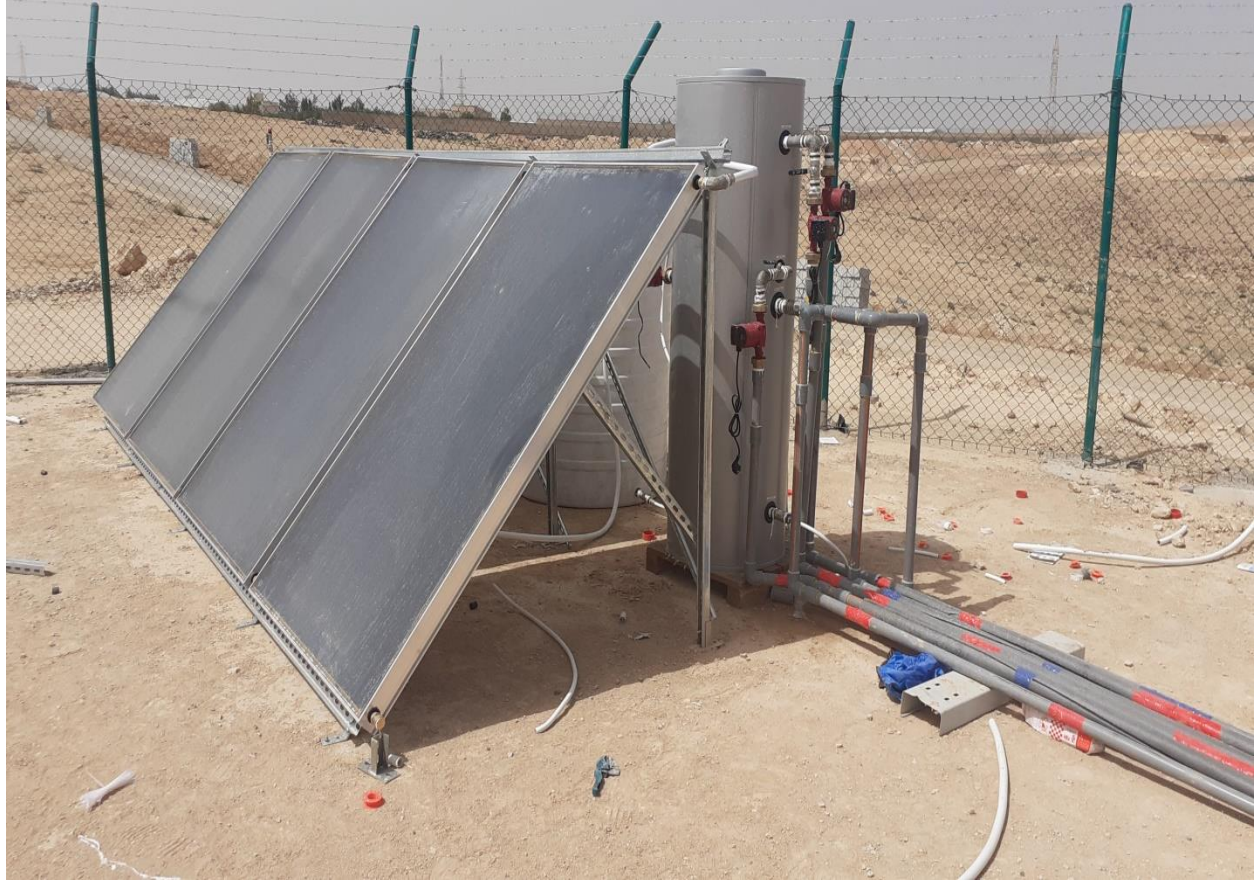

• البيوت البلاستيكية

1. تم تركيب الهيكل المعدني لبيت بلاستيكي واحد بشكل كامل و العمل جار على اتمام البيت الثاني .
2. تم التاكيد على المقاول تركيب الاسلاك الجانبية على مسافة 50 سم بين كل خط.
3. لم يتم تركيب الابواب والبلاستيك.



• المظلة
1. تم تركيب الهيكل المعدني.



• السياج

تم تركيب السياج حول المشتل كاملا عدا البوابة.

التوصيات :

1. يجب تشغيل مراوح التبريد خلال فترة الظهيرة لمنع ارتفاع درجات الحرارة داخل البيت و الاسراع في تركيب الكرتون للمحافظة على غطاء البولي كاربونيت .
2. يجب وضع نظام التدفئة على قاعدة اسمنتية.
3. يجب الاسراع بتركيب خزانات الري ليتسنى وضع شبكة الري و الخاصة بري الاشتال في بيوت الاقلمة (البلاستيكية) و المضلة .
4. يجب تركيب خزان المياه الخاص ببيت البولي كاربونيت والذي سوف يتم تزويده بالمياه النقية من الخزان الكبير التابع لبلدية الكرك.
5. سوف يتم تحديد موعد للزيارة القادمة خلال الاسبوع القادم ويجب حضور مساح البلدية لتحديد مكان الحديقة و التي ستزرع بها الامهات ليتم تحديد شبكة الري لها.

م.طارق عكاشه/م.يحيى ابوصيني
