

شركة غيث العموش وشريكه دانا للمقاولات الانشائية  
تقرير الاعمال لمشروع المشاتل الزراعية – بلدية الكرك

اليوم : الخميس  
التاريخ : ٢٠٢٠/١٢/١٠

السادة الجمعية العلمية الملكية، تجدون ادناه اهم ما تم انجازه في المشروع من تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢.

**ما تم إنجازه :**


- ١- فك البيوت البلاستيكية الزراعية القائمة و المراد إصلاحها .
- ٢- اعمال التسوية للأرض الطبيعية
- ٣- اعمال الدمك للأرض الطبيعية
- ٤- فرد طبقة من البيس كورس بمساحة ٥٠٠ متر مربع في موقع بيت التظليل وبسماكة ٢٠ سم و دكها .
- ٥- تجهيز الأرض الطبيعية وفرد طبقة من البيس كورس و دكها لرمبة الدخول الى المشروع .
- ٦- حفر ٤١ \* ١٠ متر بسماكة ٢٠ سم وذلك للتجهيز لصبة الدبش والباطون الخاصة ببيت البولي كربونيت .
- ٧- حفر القواعد الخاصة ببيت البولي كربونيت وبيت التظليل وبيوت الإصلاح الزراعية والسياج المعدني .
- ٨- تسليح القواعد الخاصة بالبيوت الزراعية وحسب المخططات الهندسية .
- ٩- تأسيس زراعة ارجل البيوت الزراعية (الإصلاح وبيت التظليل ) وبراغي الهيكل المعدني لبيت البولي كربونيت .
- ١٠- صب الباطون الخاص بقواعد بيت البولي كربونيت وبيت التظليل والبيوت البلاستيكية .



صورة رقم 3 تسوية الأرض الطبيعية ودكها



صورة رقم ٢ تسوية الأرض الطبيعية ودكها

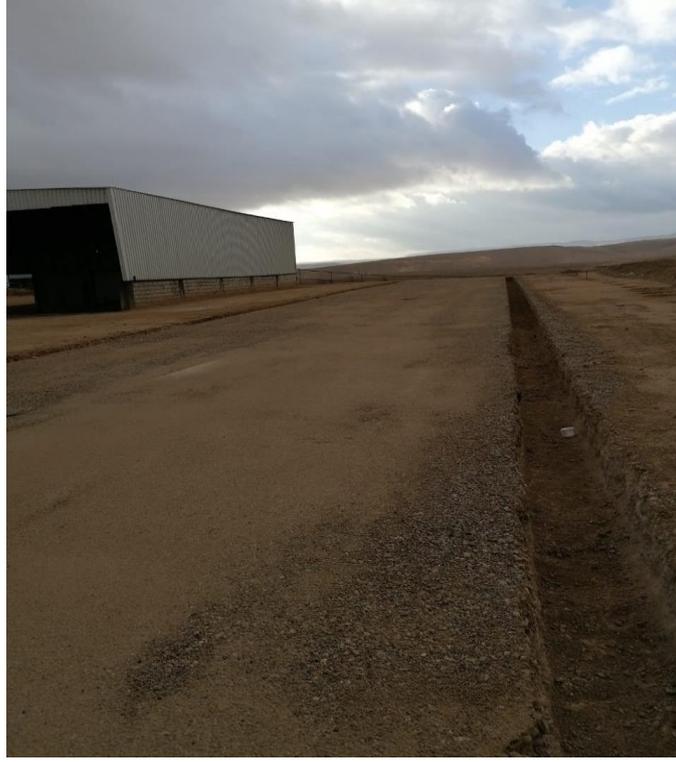

صورة رقم ٤ طبقة البيس كورس اسفل بيت التصليل وحفر قواعد



صورة رقم ٥ الحفر الخاص ببيت البولي كربونيت (قواعد وصبة الدبش والباطون)



صورة رقم ٦ الحفر الخاص في قواعد بيوت الإصلاح الزراعية



صورة رقم 7 حفر القواعد الخاصة بالسياج المعدني



صورة رقم 8 تسليح القواعد وتأسيس ارجل البيوت الزراعية



صورة رقم 9 قواعد التسليح بعد صبها بالباطون
